


**Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 10.10.2017 – 17.10.2017 KW 41/42**

**Verteiler** Baukommission  
Schulleitung  
Medienverantwortliche  
Fachplaner

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
Plattenarbeiten	Schule, Fertigstellung Plattenbelagsarbeiten im Untergeschoss. Schule, Beginn Plattenbelagsarbeiten in oberen Geschossen.	Bernasconi
Gipsarbeiten	Bepankungen aller Wände in den Nasszonen Schulhaus UG – 2.OG.	
Fassade	Schule, Fertigstellung Montage der Fassadenelemente.	Roland Salm
Flachdach	Schule, Montage Dachrandabschluss. Fertigstellung. Schule, Begrünung Flachdach.	Brunner
Lüftungsarbeiten	Schule, Aufnahme der Lüftungsarbeiten, dämmen der Steigzonen.	
Hartbeton	KIGA, Beginn der Bodenbeläge Hartbeton im Erdgeschoss. Vorbereitungsarbeiten.	Walo
Deckenbekleidung	KIGA, Fertigstellung Deckenbekleidung Holz. KIGA, Beginn Montage Metalldecken in den Nasszonen. Schule, Montage Unterkonstruktion für Fertigdecke.	
Umgebung	Fertigstellung der Umgebungsarbeiten KIGA Neu und Bestand.	Marti

**Wetterprognose**

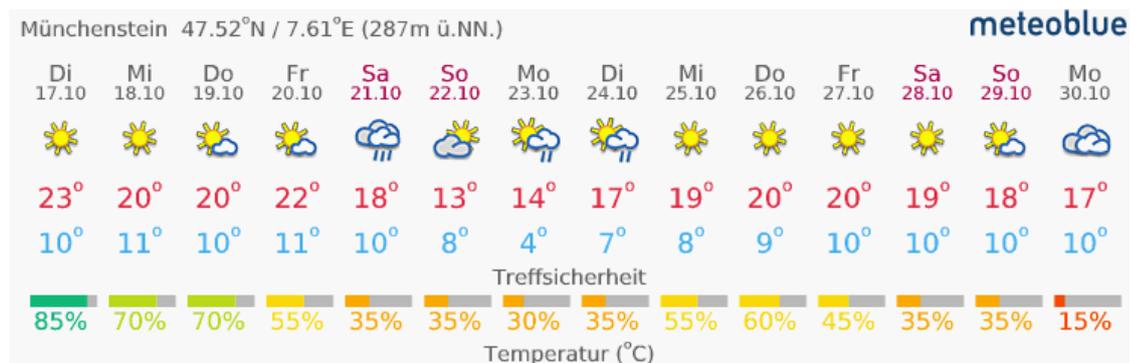

Adrian Hänggi  
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

**Schule, Vorbereitungsarbeiten für Hartbetonbelag**



**Schule, Lüftungsarbeiten, dämmen der Steigzonen.**



**KIGA, Umgebungsarbeiten, Einrichtung neuer Spielplatz**

