

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 18. Dezember 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 52/53 vom 21. Dezember 2015 bis 01. Januar 2016

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.


Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 52/53 vom 21. Dezember 2015 – 01. Januar 2015	
Anschluss Kanalisation (Frühling 2016)	Ausführung. Salathé Gartenbau
Verbindungsbau Unterlagsboden Verbindungsbau (Altbau) 23.12.2015	Sigg
Mo. 21.12.2015/ Di 22.12.2015 Sockelarbeiten Bodenbeläge Treppenhaus ab Mittwoch 23.12.2015 AB 23.12.2015 IST TREPPENHAUS GESPERRT Bodenleger arbeitet KW 53	ABT, Bodenbeläge
Fertigstellung Küche Office KW 52 exkl. Glas	Luro Küchen
Div. Fertigstellung /Balkone. Fassaden etc. bis 23.12.2015 Ab 11.01.2016 def. Fertigstellung	Mangold
Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten	Fischer AG
Fertigstellung Montage Garderoben / Schränke 04./05./06. Januar 2015 kompl. Fertigstellung	Vogel Design, Ruswil
Montage Türblätter (Absprache mit Bodenleger) bis 23.12.2015	Frank Türen AG
Umgebungsarbeiten bis 22.12.2015 Parkplätze / Zugänge	Salathé Gartenbau

Foto vom 17.12.2015

Aula



WC Knaben EG

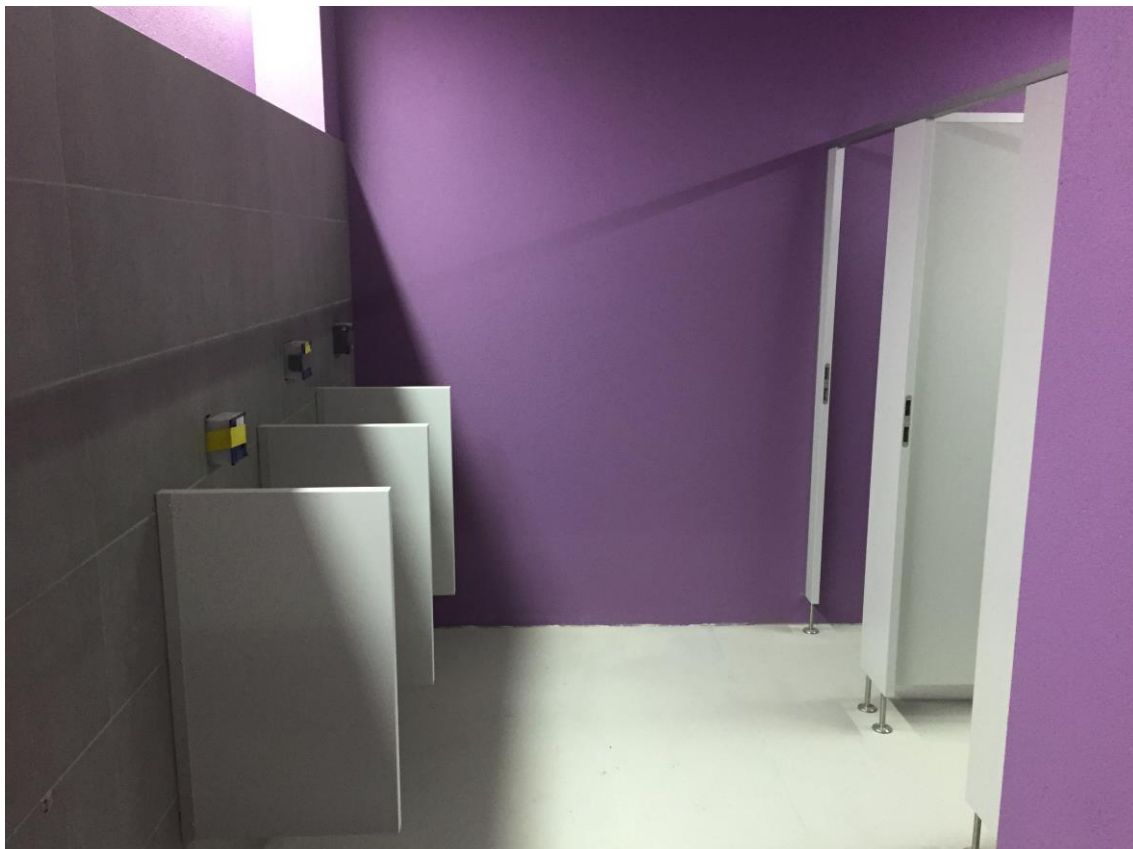

Seite 3 von 3
