

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 8. Januar 2016/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission


Kalenderwoche 02 vom 11.Januar 2016 bis 15.Januar 2016

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 02/2016 vom 11. Januar 2016 – 08. Januar 2016	
Anschluss Kanalisation (Frühling 2016)	Ausführung. Salathé Gartenbau
Bodenläge Treppenhaus bis Freitag 08.01.2016 KW 02 Sockelarbeiten (Beginn Erdgeschoss) KW 03 Sockelarbeiten Fertigstellung 1.OG / 2. OG KW 04 Lieferung und Verlegen Schmutzschleusen	ABT, Bodenbeläge
Fertigstellung Küche Office inkl. Glasrückwand bis 13.01.16/14.01.16 Glasrückwand Küchen Kindergarten 29.01.2016 (Pendenz Wasserhahn Küchen Kindergarten)	Luro Küchen
Div. Fertigstellung / Balkone u. Fassaden ab 11.01.2016 Eingang Süd mit Elektriker Lampe bündig mit Decke versetzen Fehlende Gläser (Absturzsicherungen) vor Fenster versetzen	Mangold
Fertigstellung Installationen bis KW 02 Isolationen Heizungsleitungen / Montage ->Türli BHV	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG Häsler AG
Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten Mobile Trennwände EG Treppenhaus Div. Fertigstellungen Finisharbeiten	Fischer AG
Baureinigung Beginn Fenster ab 12.01.2016	Wettstein, Münchenstein
Lieferung/ Montage Wandtafel Donnerstag 14.01.2016	L+S
Fugendichtungen Donnerstag/Freitag 14./15.01.2016	St. Zihlmann

Umgebungsarbeiten ab 11.01.2015 Erste Priorität Zugänge Vorschau Plattenarbeiten Verbindungsbau ab 19.01.2016 Lieferung Mobiliar 25.01.2016 Zügeltermin SEB Schullergänzende Betreuung 25.01.2016	Salathé Gartenbau Bernardi L+S Gemeinde
--	--

Bemerkungen Termine:

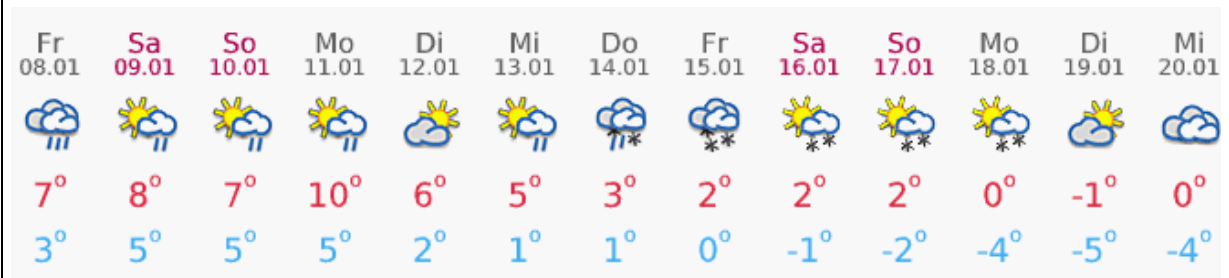

Jourfix: Dienstag 12.01.2016 Jourfix 13.15 Uhr

**Für Ordnung
und Sauberkeit ist
jeder
verantwortlich!**

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Foto vom 07.01.2016

Aula



Kindergarten



Seite 3 von 3
