


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 25.07.2017 – 01.08.2017 KW 30/31

Verteiler
Baukommission
Schulleitung
Medienverantwortliche
Fachplaner


Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
Fassade	Fertigmontage Geländer Rückfassade KIGA	Roland Salm
Flachdach	Abnahme mit Unternehmer und Bauleitung	Morath AG
Heizung	Schule, 2.OG, Setzen der Bodenheizung	Laubi Innovent
Unterlagsböden	Schule, 1.OG, Einbringen der Schlackenschicht Schule, 2.OG, Einbringen vom Unterlagsboden	Steinit AG
Plattenarbeiten	Beginn der Plattenarbeiten im KIGA 1.OG	Bernasconi
Abgehängte Decke	Montage abgehängte Holzdecke im Kindergarten EG + 1.OG	Pro Ausbau
Innentüren	Beginn Montage Türen KIGA, 1.OG	Stamm Bau

Wetterprognose

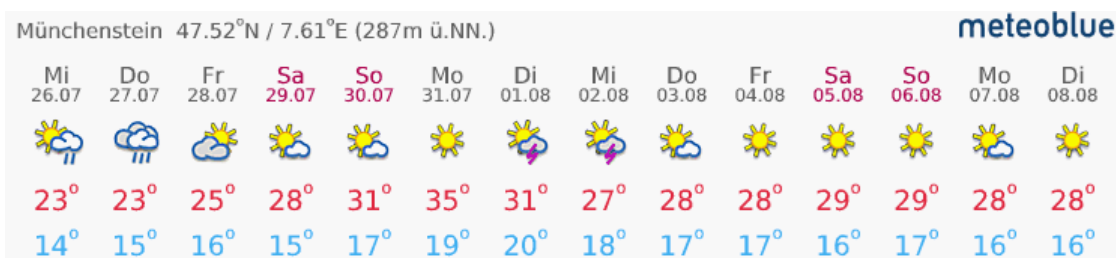

Adrian Hänggi
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

KIGA, Abnahme Flachdach

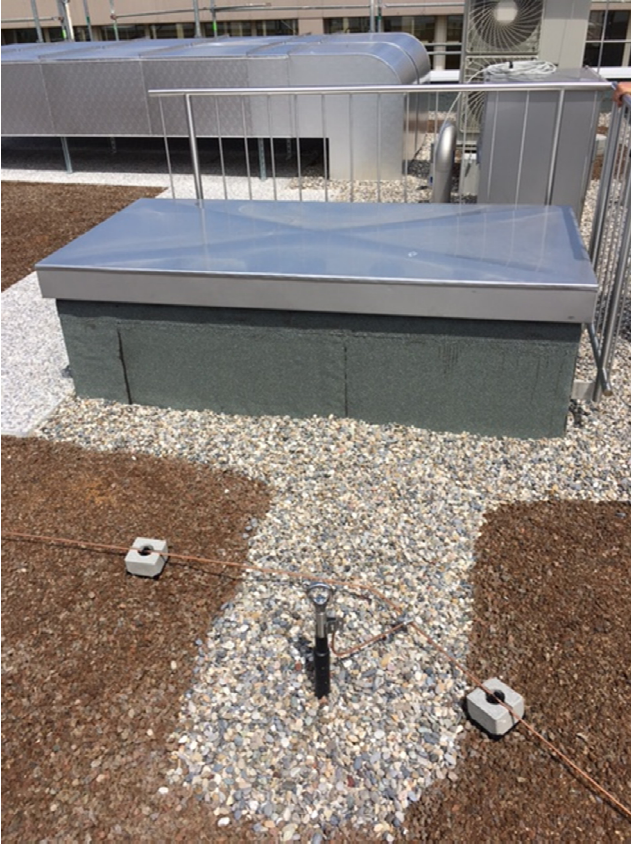

KIGA, 1.OG, Montage Türrahmen



KIGA, Fassade, Demontage Gerüst



KIGA, Rückfassade, 1.OG, Montage Geländer

